Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
1	**Project**	**800ed 9eh**	**9/8/2020**	**11/17/2022**
2	**Construction**	**801d**	**9/8/2020**	**11/17/2022**
3	**Building 1**	**506d**	**9/8/2020**	**9/2/2022**
4	**Re-Roof**	**45d**	**9/8/2020**	**11/9/2020**
5	Demolition/Re-roof	45d	9/8/2020	11/9/2020
6	**Rennovation**	**177d**	**12/27/2021**	**9/2/2022**
7	Abatement	25d	12/27/2021	1/31/2022
8	Demolition	20d	1/24/2022	2/18/2022
9	Foundation	10d	2/21/2022	3/4/2022
10	PEMB	45d	3/7/2022	5/6/2022
11	MEP Rough-In	50d	3/7/2022	5/13/2022
12	Exterior	60d	5/9/2022	8/2/2022
13	Roof Repairs after MEP	5d	5/16/2022	5/20/2022
14	Finishes	60d	5/16/2022	8/9/2022
15	Tab	10d	8/8/2022	8/19/2022
16	Punchlist	10d	8/8/2022	8/19/2022
17	Owner Move-In	10d	8/22/2022	9/2/2022
18	**Building 2**	**332d**	**9/8/2020**	**8/5/2021**
19	Abatement	35d	9/8/2020	10/26/2020
20	Demolition	40d	9/25/2020	11/19/2020
21	Framing	60d	10/14/2020	1/11/2021
22	Roofing	70d	10/30/2020	2/10/2021
23	MEP Rough-In	110d	11/18/2020	4/26/2021
24	Finishes	150d	12/7/2020	7/8/2021
25	Exterior	110d	2/5/2021	7/12/2021
26	TAB	10d	7/6/2021	7/19/2021
27	Punchlist	10d	7/9/2021	7/22/2021
28	Owner Move-In	10d	7/23/2021	8/5/2021
29	**Building 7**	**389d**	**9/8/2020**	**3/21/2022**
30	**Addition**	**215d**	**9/8/2020**	**7/13/2021**
31	Owner Move-In	10d	3/8/2022	3/21/2022
32	Demolition	5d	9/8/2020	9/14/2020
33	Excavation	5d	9/15/2020	9/21/2020

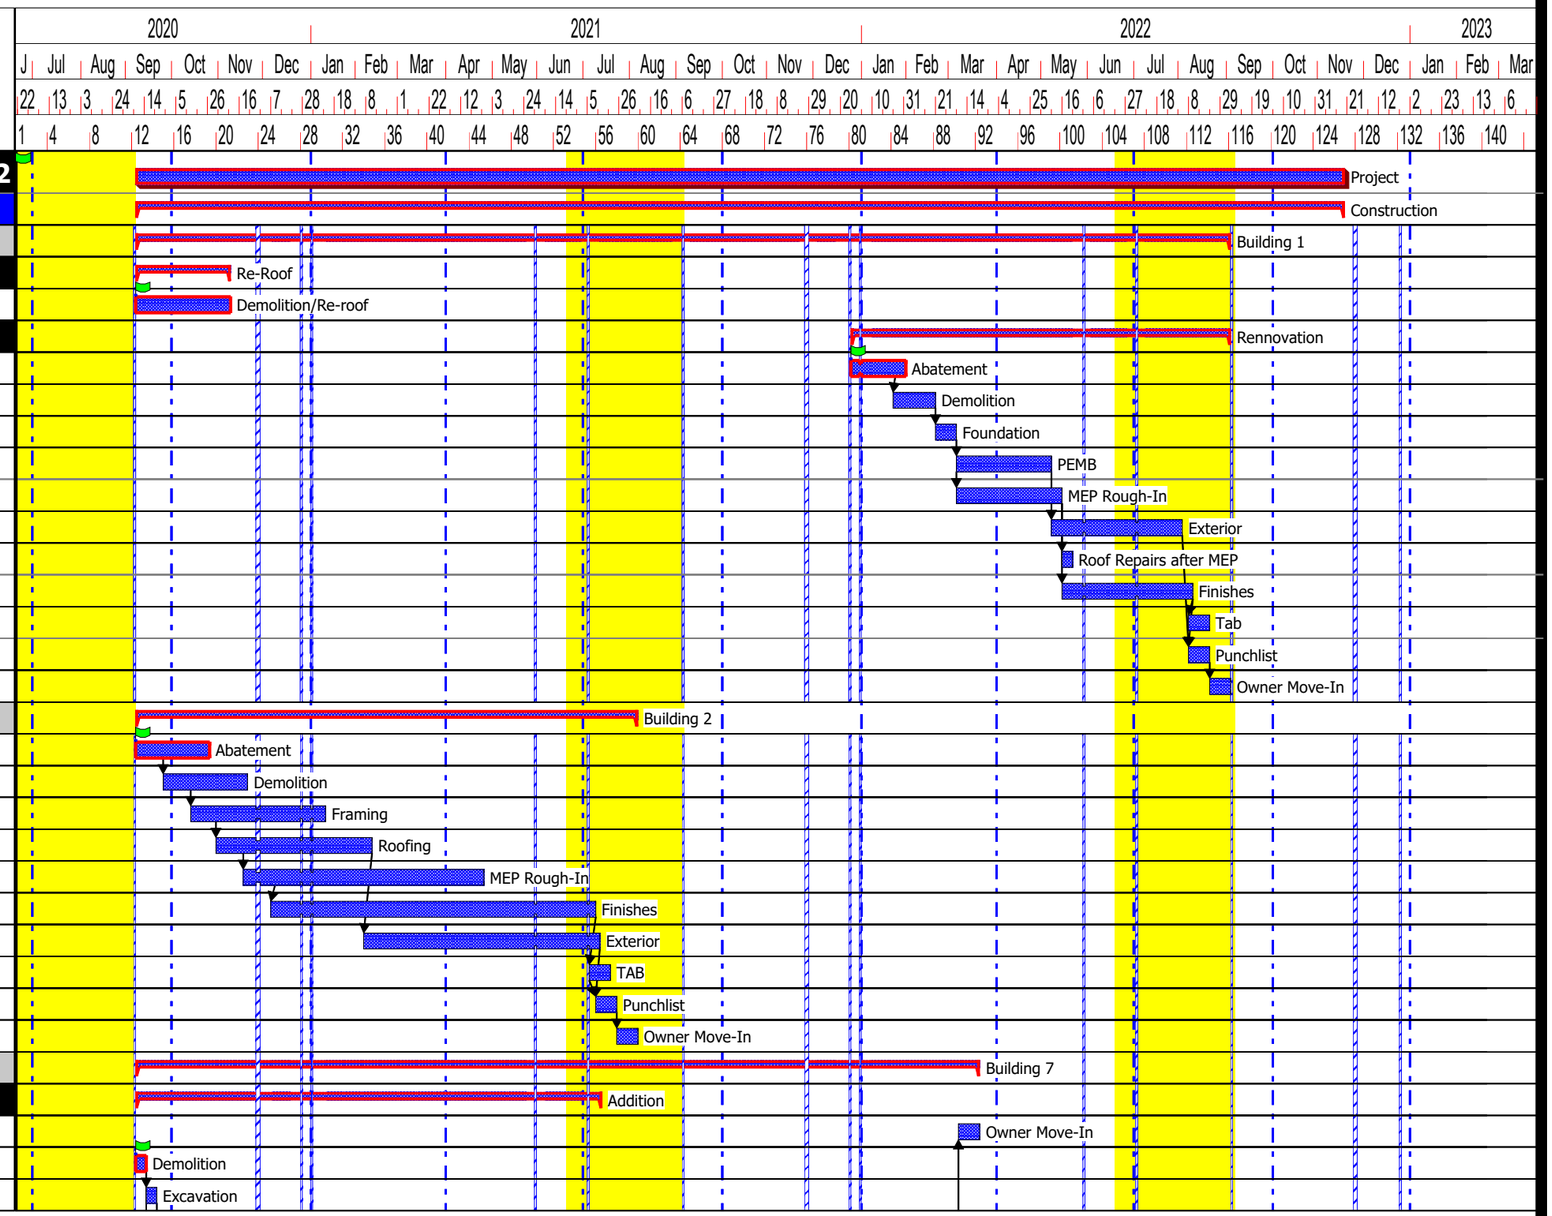

WENAHA GROUP

Architects West

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
34	Foundation	15d	9/22/2020	10/12/2020
35	Underground Piping	15d	10/13/2020	11/2/2020
36	SOG	5d	11/3/2020	11/9/2020
37	Structure	20d	11/10/2020	12/9/2020
38	Framing	45d	12/8/2020	2/10/2021
39	Building envelope	30d	2/9/2021	3/22/2021
40	MEP Rough-In	35d	3/23/2021	5/10/2021
41	Masonry/Siding	25d	3/23/2021	4/26/2021
42	Exterior	20d	4/27/2021	5/24/2021
43	Finishes	25d	5/11/2021	6/15/2021
44	TAB	10d	6/15/2021	6/28/2021
45	Punchlist	10d	6/15/2021	6/28/2021
46	Owner Move-In	10d	6/29/2021	7/13/2021
47	**Rennovation**	**165d**	**7/13/2021**	**3/7/2022**
48	Abatement	25d	7/13/2021	8/16/2021
49	Demolition	20d	8/17/2021	9/14/2021
50	Framing	30d	9/14/2021	10/25/2021
51	Roofing	30d	9/14/2021	10/25/2021
52	MEP Rough-In	30d	10/26/2021	12/8/2021
53	Exterior	30d	10/26/2021	12/8/2021
54	Finishes	30d	12/7/2021	1/19/2022
55	Theater Finishes	25d	1/18/2022	2/21/2022
56	TAB	10d	2/22/2022	3/7/2022
57	Punchlist	10d	2/22/2022	3/7/2022
58	**Building 4**	**343d**	**9/15/2020**	**8/23/2021**
59	**Addition**	**161d**	**9/15/2020**	**5/3/2021**
60	Demolition	10d	9/15/2020	9/28/2020
61	Excavation	5d	9/29/2020	10/5/2020
62	Foundation	20d	10/6/2020	11/2/2020
63	Underground Piping	10d	11/3/2020	11/16/2020
64	SOG	5d	11/17/2020	11/23/2020
65	Structure	30d	11/24/2020	1/8/2021
66	Framing	30d	12/8/2020	1/20/2021

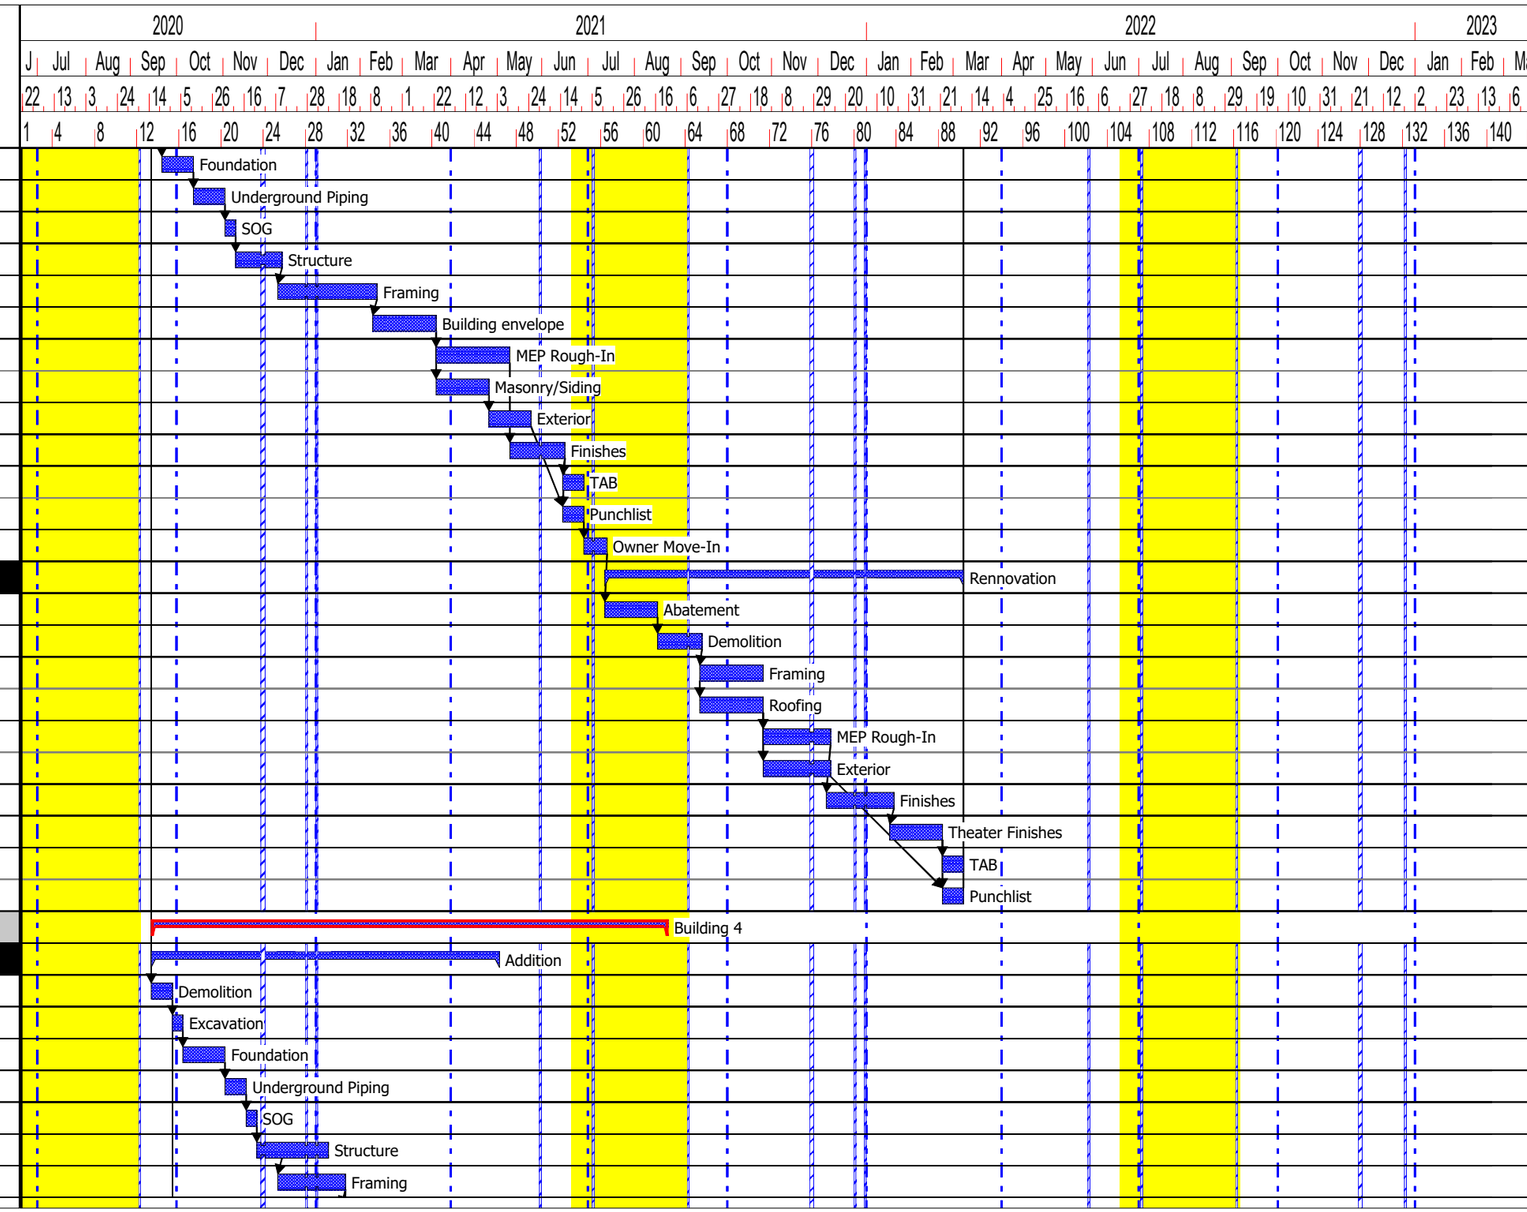

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
67	Building envelope	25d	1/19/2021	2/22/2021
68	MEP Rough-In	30d	2/9/2021	3/22/2021
69	Masonry/Siding	30d	2/23/2021	4/5/2021
70	Finishes	30d	3/23/2021	5/3/2021
71	**South Library Rennovation**	**229d**	**9/29/2020**	**8/23/2021**
72	Demolition	20d	9/29/2020	10/26/2020
73	Framing	15d	10/27/2020	11/16/2020
74	Roofing	30d	11/17/2020	12/31/2020
75	MEP Rough-In	30d	1/19/2021	3/1/2021
76	Finishes	60d	3/2/2021	5/24/2021
77	Exterior	75d	3/5/2021	6/18/2021
78	Tab	10d	7/27/2021	8/9/2021
79	Punchlist	10d	7/27/2021	8/9/2021
80	Owner Move-In	10d	8/10/2021	8/23/2021
81	**North Library Rennovation**	**135d**	**1/19/2021**	**7/28/2021**
82	Zone 1	45d	1/19/2021	3/22/2021
83	Zone 2	45d	3/23/2021	5/24/2021
84	Zone 3	45d	5/25/2021	7/28/2021
85	**Building 6**	**354d**	**9/29/2020**	**9/17/2021**
86	**Addition**	**190d**	**9/29/2020**	**6/28/2021**
87	Demolition	20d	9/29/2020	10/26/2020
88	Excavation	5d	10/27/2020	11/2/2020
89	Foundation	10d	11/3/2020	11/16/2020
90	Underground Piping	10d	11/17/2020	12/2/2020
91	SOG	5d	12/1/2020	12/7/2020
92	Structure	15d	12/8/2020	12/29/2020
93	Framing	30d	12/29/2020	2/9/2021
94	Building envelope	30d	2/9/2021	3/22/2021
95	Masonry/Siding	30d	2/23/2021	4/5/2021
96	MEP Rough-In	30d	3/23/2021	5/3/2021
97	Finishes	20d	5/4/2021	6/1/2021
98	TAB	10d	6/1/2021	6/14/2021
99	Punchlist	10d	6/1/2021	6/14/2021

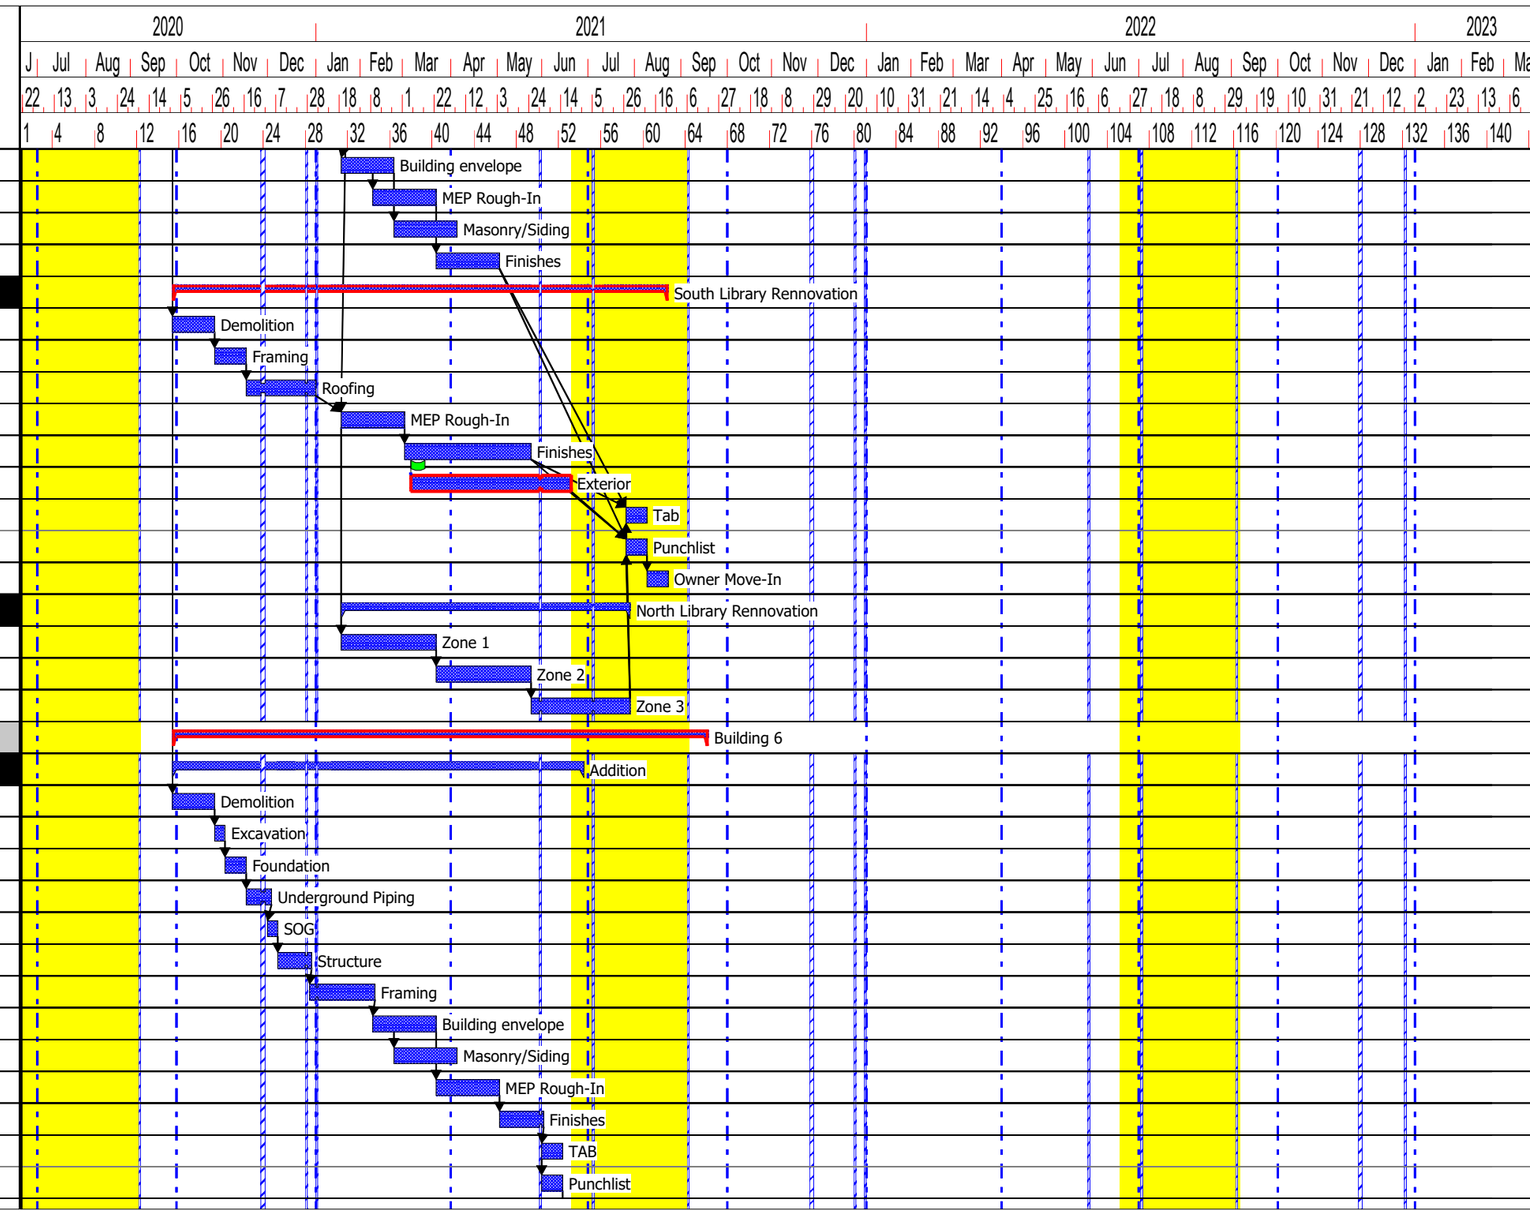

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
100	Owner Move-In	10d	6/15/2021	6/28/2021
101	**Main Upgrades**	**108d**	**4/12/2021**	**9/13/2021**
102	Abatement	30d	4/12/2021	5/21/2021
103	Demolition	30d	5/3/2021	6/14/2021
104	MEP rough-In	30d	5/10/2021	6/21/2021
105	Exterior	50d	6/14/2021	8/23/2021
106	Framing	25d	6/21/2021	7/26/2021
107	Finishes	25d	7/26/2021	8/27/2021
108	TAB	10d	8/30/2021	9/13/2021
109	Punchlist	10d	8/30/2021	9/13/2021
110	**1960's Locker Rooms**	**112d**	**4/12/2021**	**9/17/2021**
111	Abatement	30d	4/12/2021	5/21/2021
112	Demolition	30d	5/3/2021	6/14/2021
113	MEP rough-In	20d	5/24/2021	6/21/2021
114	Framing	25d	6/21/2021	7/26/2021
115	Finishes	25d	7/26/2021	8/27/2021
116	TAB	10d	8/30/2021	9/13/2021
117	Punchlist	10d	8/30/2021	9/13/2021
118	Owner Move-In	5d	9/13/2021	9/17/2021
119	**Site**	**439d**	**3/1/2021**	**11/17/2022**
120	**Pedestrian Bridge**	**84d**	**3/1/2021**	**6/25/2021**
121	Abutments	30d	3/1/2021	4/9/2021
122	Bridge Deck and Rail	25d	4/12/2021	5/14/2021
123	Grading	15d	5/17/2021	6/7/2021
124	Approaches	5d	6/7/2021	6/11/2021
125	Landscaping	10d	6/14/2021	6/25/2021
126	**Parking Lot 6**	**88d**	**6/21/2021**	**10/22/2021**
127	Demolition	20d	6/21/2021	7/19/2021
128	Rough Grading	10d	7/19/2021	7/30/2021
129	Drainage Facilities	15d	8/2/2021	8/20/2021
130	Utilities Underground	25d	8/2/2021	9/3/2021
131	Curbs and Walks	20d	9/7/2021	10/4/2021
132	Landscaping/Irrigation	25d	9/20/2021	10/22/2021

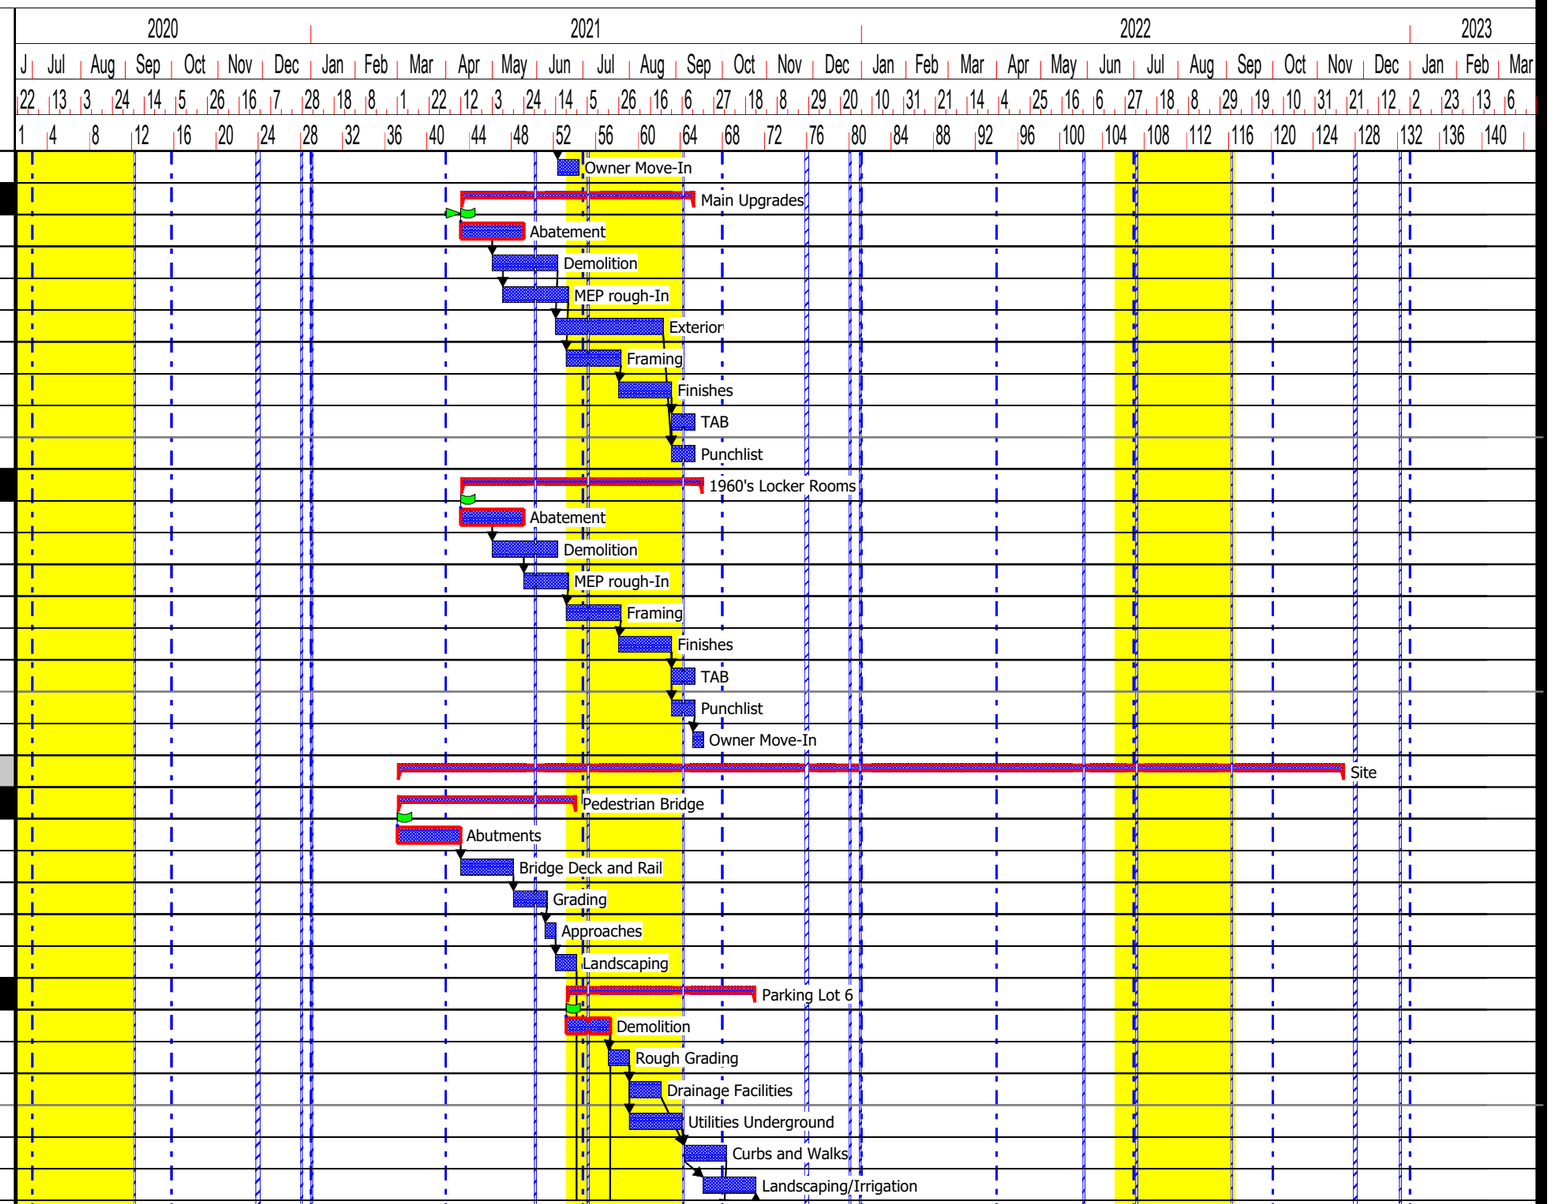

WENAHA GROUP

Architects West

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
133	Paving	5d	10/4/2021	10/8/2021
134	Accessories	10d	10/11/2021	10/22/2021
135	**Parking Lot 7**	**49d**	**6/28/2021**	**9/3/2021**
136	Demolition	5d	6/28/2021	7/2/2021
137	Rough Grading	5d	7/6/2021	7/12/2021
138	Drainage Facilities	15d	7/12/2021	7/30/2021
139	Utilities Underground	15d	7/12/2021	7/30/2021
140	Curbs and Walks	10d	8/2/2021	8/13/2021
141	Landscaping/Irrigation	25d	8/2/2021	9/3/2021
142	Paving	5d	8/16/2021	8/20/2021
143	Accessories	10d	8/23/2021	9/3/2021
144	**Parking Lot 8**	**49d**	**7/6/2021**	**9/13/2021**
145	Demolition	5d	7/6/2021	7/12/2021
146	Rough Grading	5d	7/12/2021	7/16/2021
147	Drainage Facilities	15d	7/19/2021	8/6/2021
148	Utilities Underground	5d	7/19/2021	7/23/2021
149	Curbs and Walks	10d	8/9/2021	8/20/2021
150	Landscaping/Irrigation	25d	8/9/2021	9/13/2021
151	Paving	5d	8/23/2021	8/27/2021
152	Accessories	5d	8/30/2021	9/3/2021
153	**Parking Lot 9**	**60d**	**7/12/2021**	**10/4/2021**
154	Demolition	5d	7/12/2021	7/16/2021
155	Rough Grading	5d	7/19/2021	7/23/2021
156	Drainage Facilities	15d	7/26/2021	8/13/2021
157	Utilities Underground	5d	7/26/2021	7/30/2021
158	Curbs and Walks	10d	8/16/2021	8/27/2021
159	Paving	5d	8/30/2021	9/3/2021
160	Landscaping/Irrigation	25d	8/30/2021	10/4/2021
161	Accessories	5d	9/7/2021	9/13/2021
162	**Parking Lot 5**	**79d**	**7/19/2021**	**11/5/2021**
163	Demolition	10d	7/19/2021	7/30/2021
164	Rough Grading	10d	8/2/2021	8/13/2021
165	Drainage Facilities	15d	8/16/2021	9/3/2021

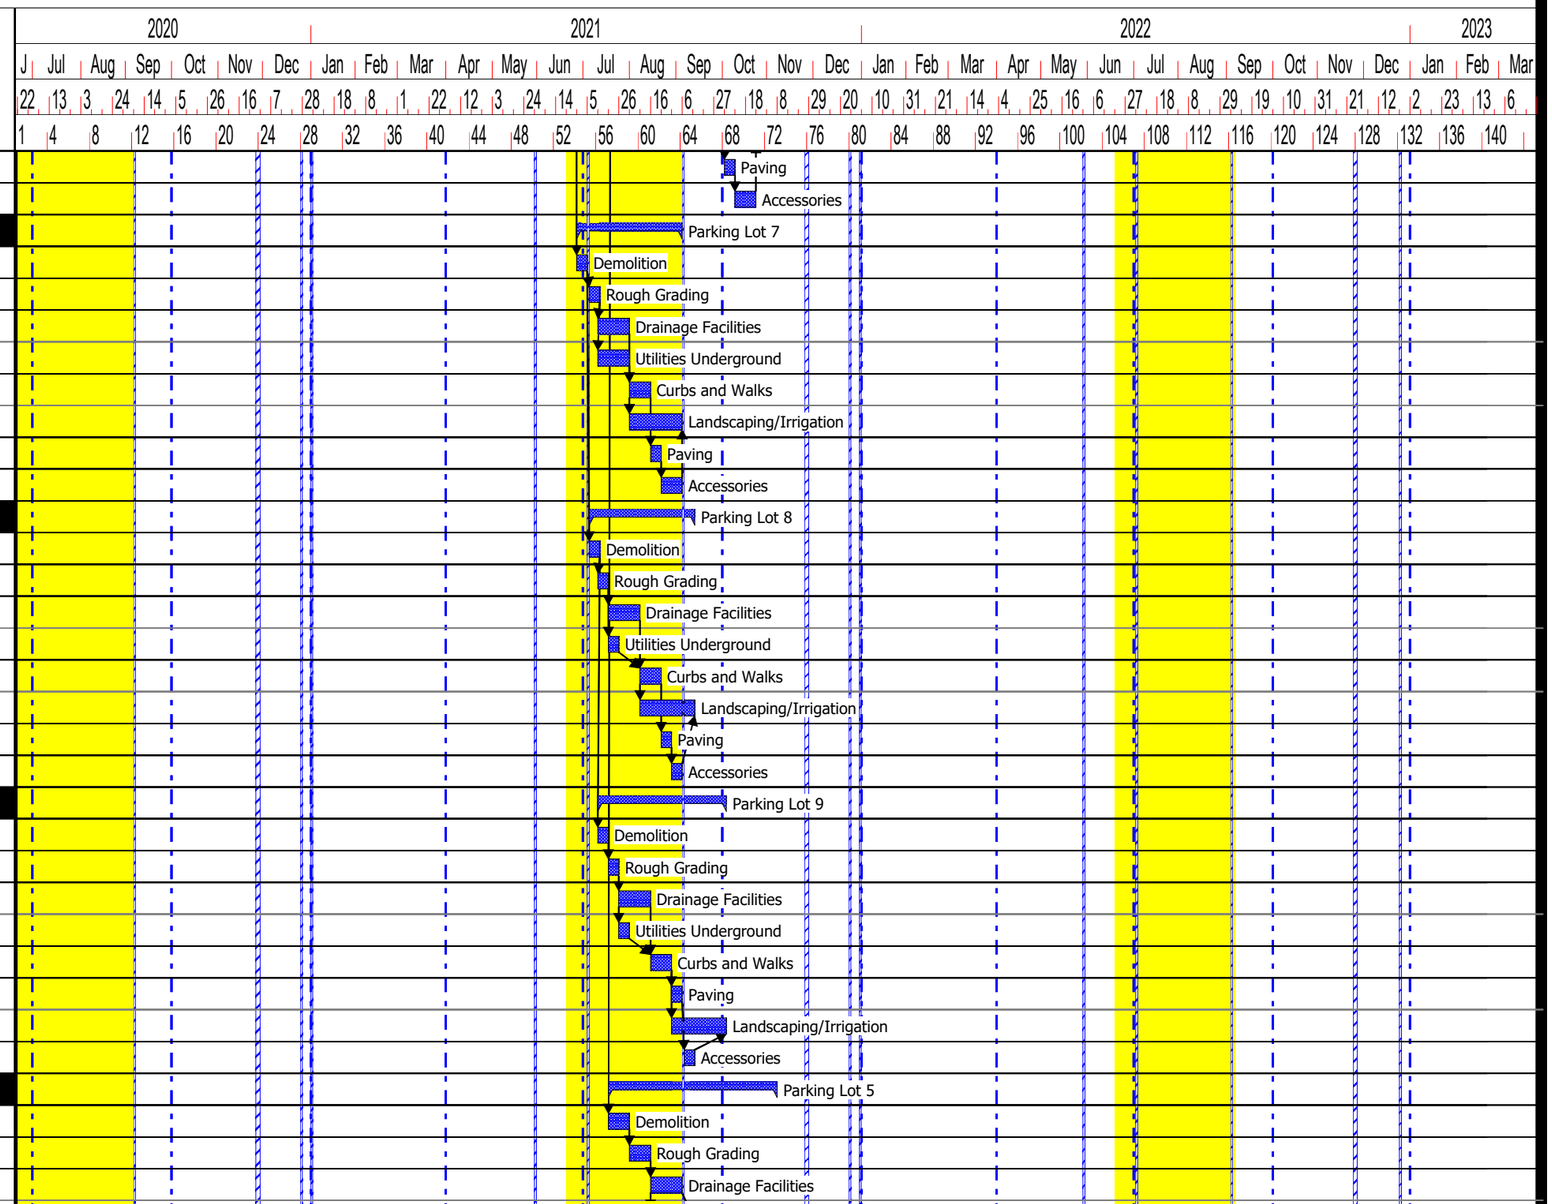

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
166	Utilities Underground	25d	8/16/2021	9/20/2021
167	Curbs and Walks	20d	9/20/2021	10/15/2021
168	Landscaping/Irrigation	25d	10/4/2021	11/5/2021
169	Paving	5d	10/18/2021	10/22/2021
170	Accessories	10d	10/25/2021	11/5/2021
171	**Parking Lot 2**	**59d**	**4/25/2022**	**7/18/2022**
172	Demolition	5d	4/25/2022	4/29/2022
173	Rough Grading	10d	5/2/2022	5/13/2022
174	Drainage Facilities	15d	5/16/2022	6/6/2022
175	Utilities Underground	15d	6/6/2022	6/24/2022
176	Curbs and Walks	5d	6/27/2022	7/1/2022
177	Landscaping/Irrigation	15d	6/27/2022	7/18/2022
178	Paving	5d	7/5/2022	7/11/2022
179	Accessories	5d	7/11/2022	7/15/2022
180	**Parking Lot 3**	**59d**	**5/2/2022**	**7/25/2022**
181	Demolition	5d	5/2/2022	5/6/2022
182	Rough Grading	10d	5/9/2022	5/20/2022
183	Drainage Facilities	15d	5/23/2022	6/13/2022
184	Utilities Underground	15d	6/13/2022	7/1/2022
185	Curbs and Walks	5d	7/5/2022	7/11/2022
186	Landscaping/Irrigation	15d	7/5/2022	7/25/2022
187	Paving	5d	7/11/2022	7/15/2022
188	Accessories	5d	7/18/2022	7/22/2022
189	**Parking Lot 4**	**49d**	**5/9/2022**	**7/18/2022**
190	Demolition	5d	5/9/2022	5/13/2022
191	Rough Grading	5d	5/16/2022	5/20/2022
192	Drainage Facilities	15d	5/23/2022	6/13/2022
193	Utilities Underground	15d	5/23/2022	6/13/2022
194	Curbs and Walks	10d	6/13/2022	6/24/2022
195	Landscaping/Irrigation	25d	6/13/2022	7/18/2022
196	Paving	5d	6/27/2022	7/1/2022
197	Accessories	10d	7/5/2022	7/18/2022
198	**Parking Lot 1**	**122d**	**5/27/2022**	**11/17/2022**

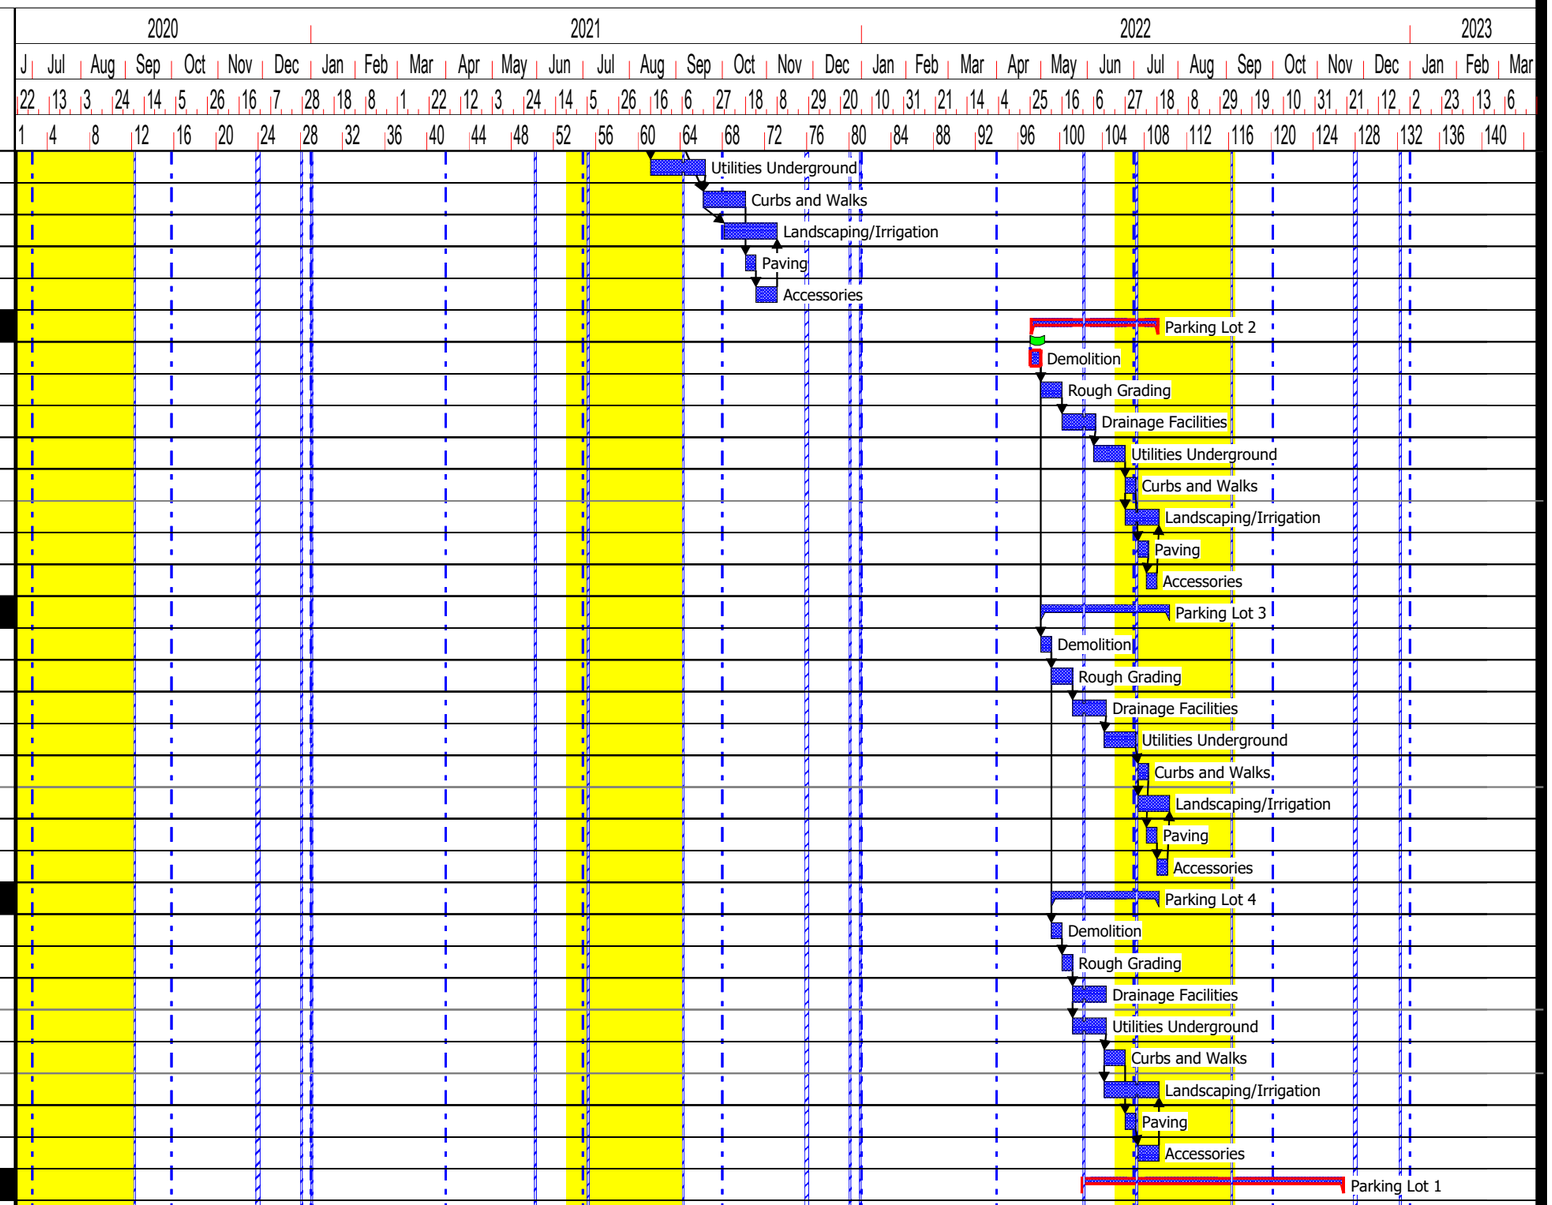

WENAHA GROUP

Architects West

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
199	Demolition	15d	5/27/2022	6/17/2022
200	Rough Grading	15d	6/17/2022	7/8/2022
201	Drainage Facilities	25d	7/8/2022	8/11/2022
202	Utilities Underground	25d	8/12/2022	9/16/2022
203	Curbs and Walks	20d	9/16/2022	10/13/2022
204	Landscaping/Irrigation	25d	9/30/2022	11/3/2022
205	Paving	5d	10/14/2022	10/20/2022
206	Accessories	10d	10/21/2022	11/3/2022
207	Punchlist	10d	11/4/2022	11/17/2022
208	**Building 3**	**376d**	**5/17/2021**	**5/27/2022**
209	**Addition**	**228d**	**5/17/2021**	**4/8/2022**
210	Demolition	10d	5/17/2021	5/28/2021
211	Excavation	5d	6/1/2021	6/7/2021
212	Foundation	15d	6/7/2021	6/25/2021
213	Underground Piping	15d	6/28/2021	7/19/2021
214	SOG	5d	7/19/2021	7/23/2021
215	Structure	15d	7/26/2021	8/13/2021
216	Framing	30d	8/16/2021	9/27/2021
217	Building envelope	30d	9/27/2021	11/5/2021
218	Masonry/Siding	30d	11/8/2021	12/21/2021
219	MEP Rough-In	45d	11/8/2021	1/13/2022
220	Finishes	45d	1/10/2022	3/11/2022
221	TAB	10d	3/14/2022	3/25/2022
222	Punchlist	10d	3/14/2022	3/25/2022
223	Owner Move-In	10d	3/28/2022	4/8/2022
224	**Kitchen**	**126d**	**6/21/2021**	**12/17/2021**
225	Abatement	15d	6/21/2021	7/12/2021
226	Demolition	15d	7/12/2021	7/30/2021
227	Underground Piping	10d	8/2/2021	8/13/2021
228	Slab Pours	5d	8/16/2021	8/20/2021
229	Framing	15d	8/23/2021	9/13/2021
230	MEP Rough-In	20d	8/23/2021	9/20/2021
231	Finishes	20d	9/20/2021	10/15/2021

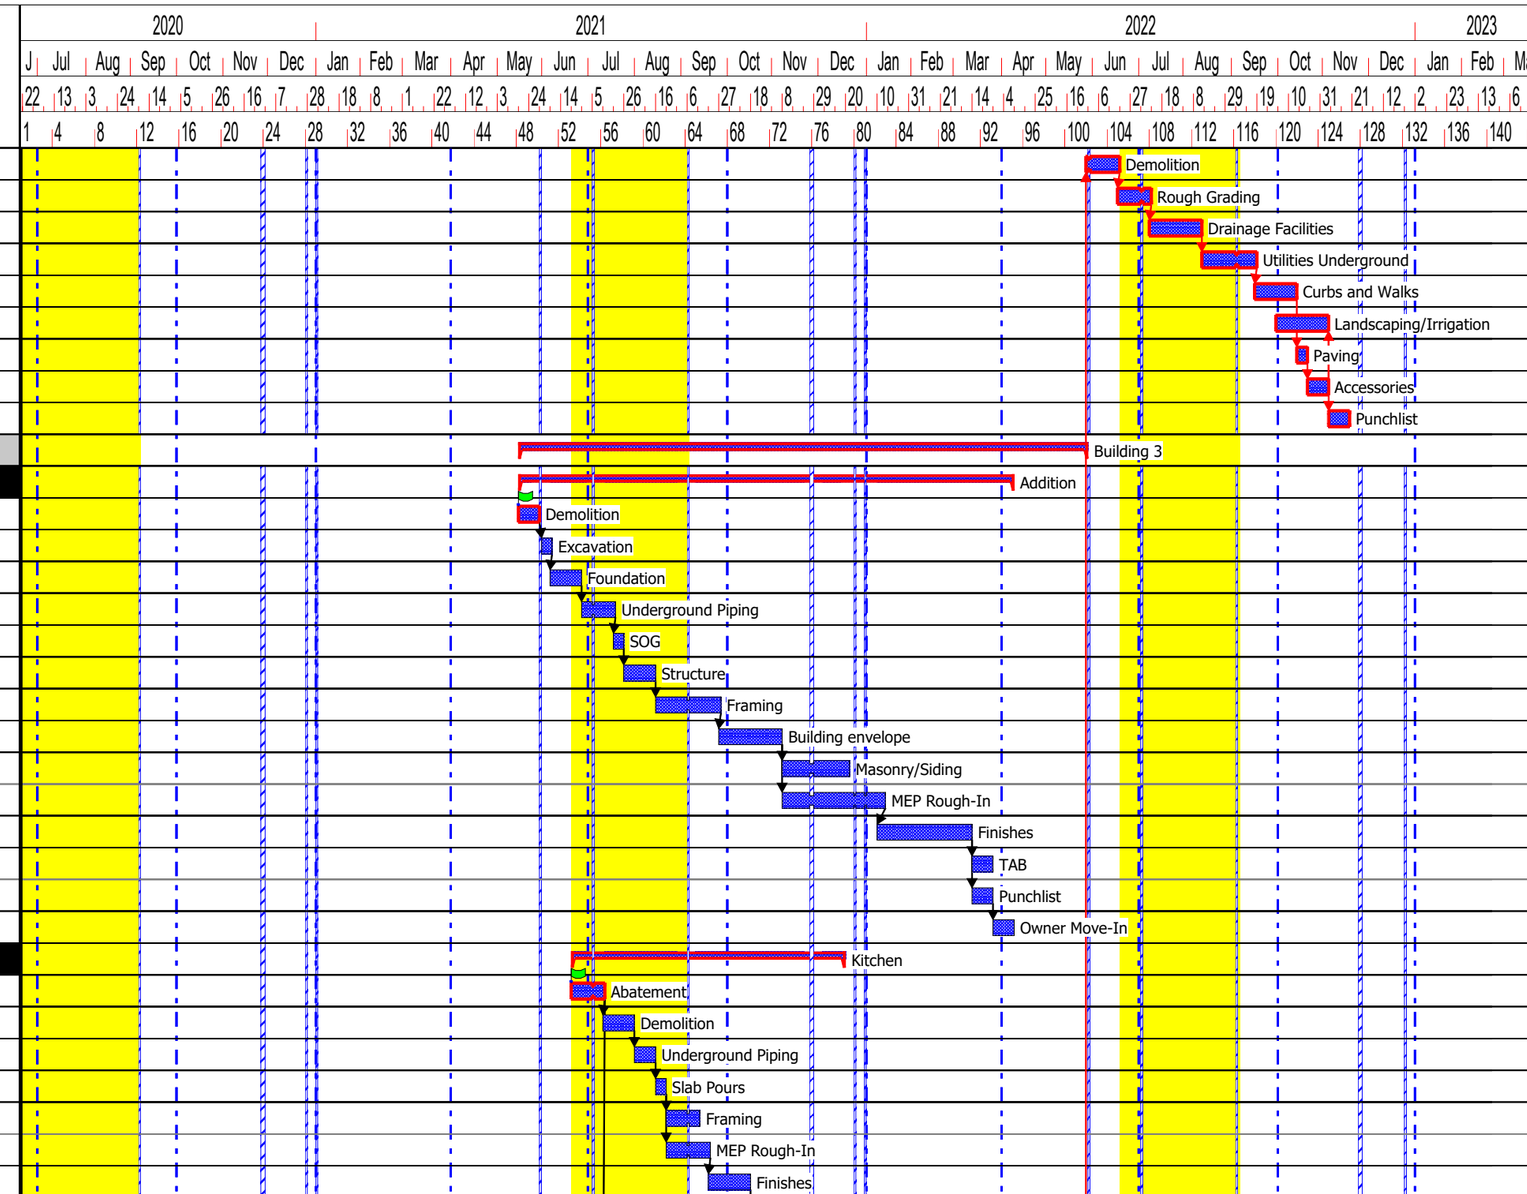

WENAHA GROUP

Architects West

Walla Walla Public Schools

WA-HI Main

Jackson CONTRACTOR GROUP, INC.

Line	Name	Duration	Start	Finish
232	Equipment Install	25d	10/18/2021	11/19/2021
233	TAB	10d	11/22/2021	12/7/2021
234	Punchlist	10d	11/22/2021	12/7/2021
235	Owner Move-In	10d	12/6/2021	12/17/2021
236	**Rennovation**	**225d**	**7/12/2021**	**5/27/2022**
237	Abatement	25d	7/12/2021	8/13/2021
238	Demolition	30d	8/16/2021	9/27/2021
239	Framing	35d	9/27/2021	11/12/2021
240	Roofing	60d	11/15/2021	2/10/2022
241	MEP Rough-In	40d	12/27/2021	2/21/2022
242	Exterior	60d	2/7/2022	4/29/2022
243	Finishes	30d	2/21/2022	4/1/2022
244	Tab	10d	4/4/2022	4/15/2022
245	Punchlist	10d	5/2/2022	5/13/2022
246	Owner Move-In	10d	5/16/2022	5/27/2022
247	**Building 5**	**439d**	**6/21/2021**	**9/2/2022**
248	Abatement	60d	6/21/2021	9/14/2021
249	Demolition	60d	8/2/2021	10/25/2021
250	Framing	60d	9/13/2021	12/7/2021
251	Roofing	45d	12/6/2021	2/8/2022
252	MEP Rough-In	60d	2/7/2022	4/29/2022
253	Exterior	60d	3/4/2022	5/26/2022
254	Finishes	70d	5/2/2022	8/9/2022
255	Tab	10d	8/8/2022	8/19/2022
256	Punchlist	10d	8/8/2022	8/19/2022
257	Owner Move-In	10d	8/22/2022	9/2/2022
258	**Building 8**	**25d**	**7/5/2022**	**8/8/2022**
259	Tie into new systems	25d	7/5/2022	8/8/2022

WENAHA GROUP

Architects West
